




Chiemseerundweg – Stand der Umsetzung

Abwasser- und Umweltverband Chiemsee
Chiemseekonferenz am Freitag, 19.11.2010, in Grabenstätt

Chiemseerundweg: Status (Auswahl)

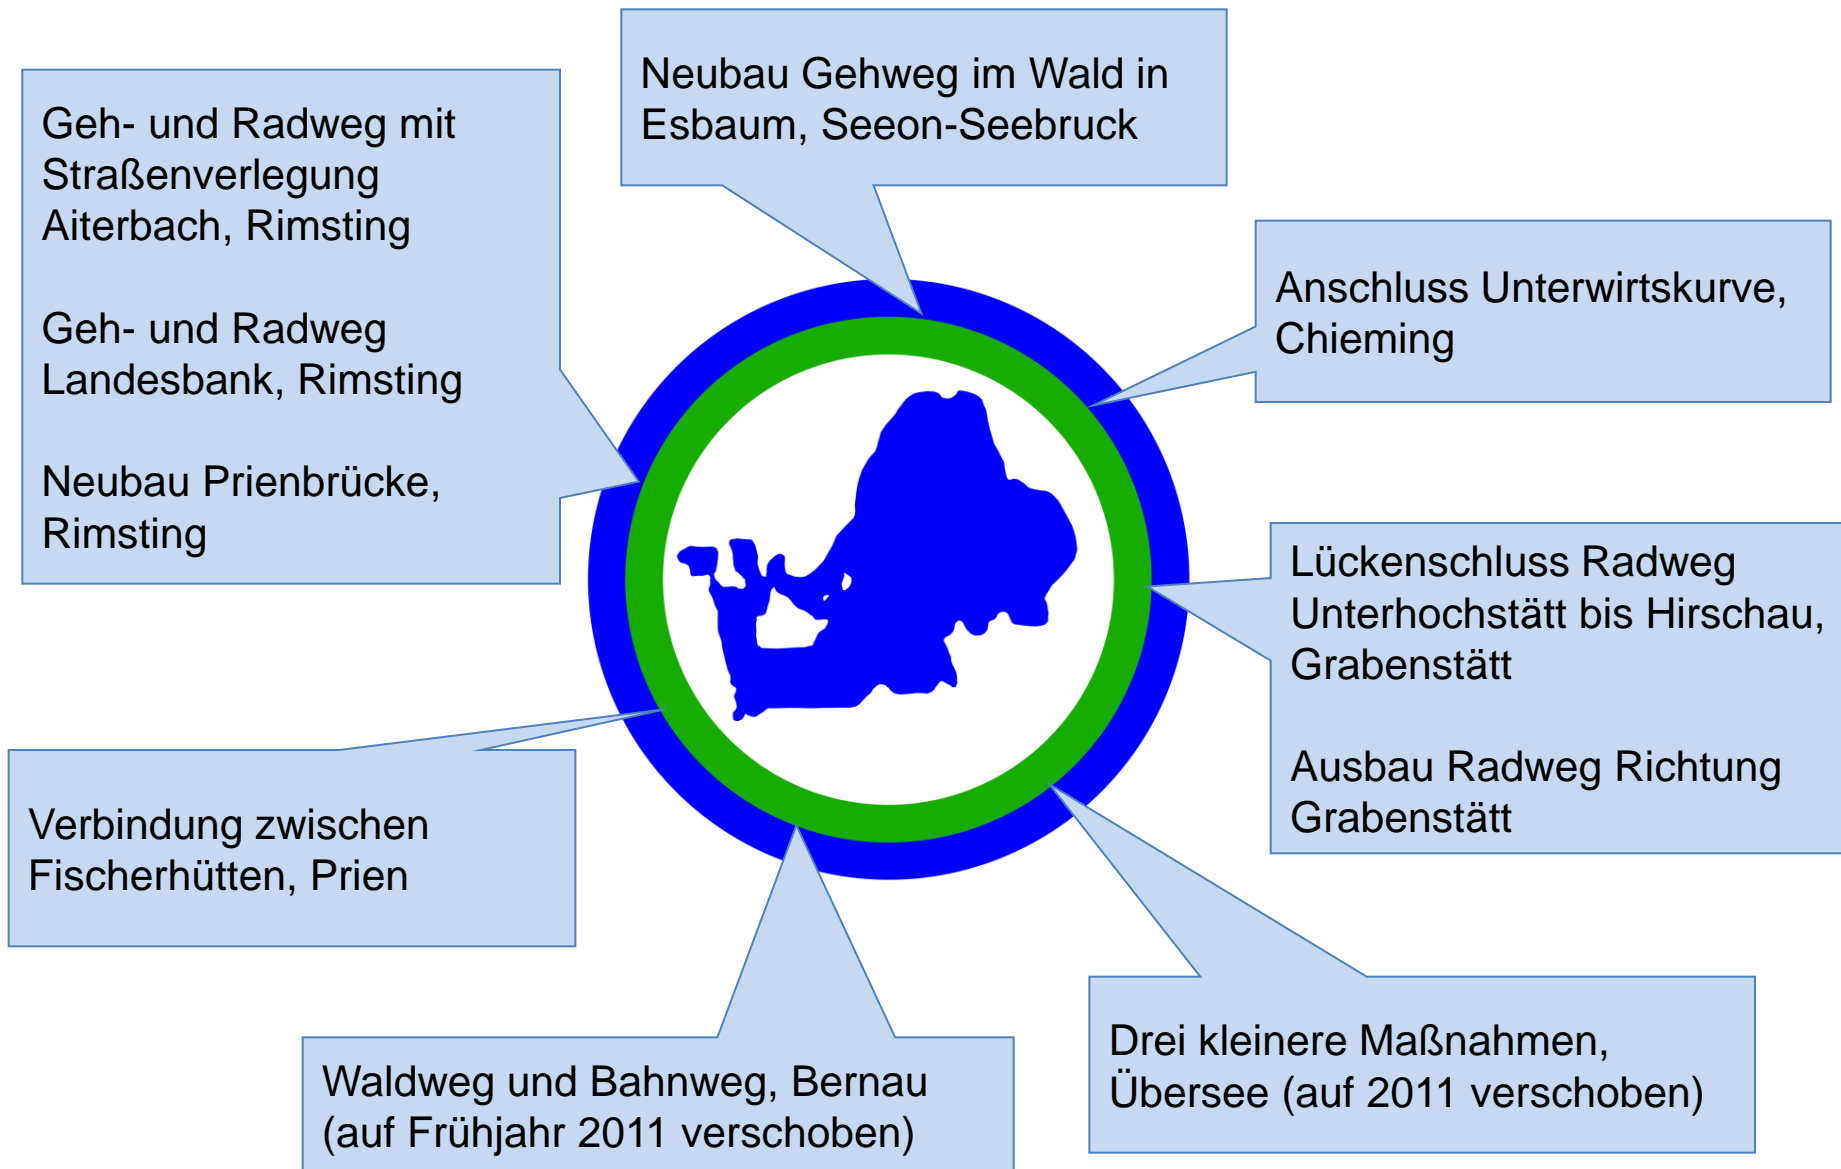

Bisher gebaute Maßnahmen

In Ausführung
Fertiggestellt
Finanzierung
Geschätzte Kosten
Auszahlung brutto

1.04	Neubau Gehweg im Wald, Esbaum	x	-	FAG	56.049 Euro	0 Euro
2.04	Umbau Unterwirtscurve, Chieming	x	-	FAG	20.944 Euro	0 Euro
3.01	Neubau Radweg Hirschau - Hagenau	x	-	SBA TS	213.962 Euro	100.399 Euro
3.04	Ausbau Radweg Richtung Grabenstätt	x	-	FAG	166.005 Euro	87.000 Euro
6.09	Ausbau Polizeisteg – Fischhütte Reiter, Prien	-	x	FAG	7.021 Euro	13.072 Euro
7.02	Neubau Prienbrücke, Rimsting	x	-	FAG	255.017 Euro	2.772 Euro
7.04	Geh- und Radweg Landesbank, Rimsting	-	x	SBA RO	64.974 Euro	67.826 Euro
7.05	Radweg mit Straßenverlegung, Rimsting	-	x	Sond	418.047 Euro	418.047 Euro
Baukosten brutto ohne Grunderwerb und Nebenkosten					1.202.019 Euro	627.365 Euro

Baukosten brutto gesamt: 7.696.920 Euro

Einheitliche Beschilderung

Hauptwegweiser Radweg



Hauptwegweiser Fußweg



Zwischenwegweiser



Service-Schilder

Badeplatz	50 m
-----------	------



Badeplatz	50 m
-----------	------

Qualitätsprodukt Chiemseerundweg

- Landschaftsbild pflegen
→ Bepflanzung startet jetzt am Abschnitt Rimsting-Aiterbach
- Ökologische Verbesserung durch Ausgleichsflächen (2,7 ha)
→ in Arbeit
- Servicemaßnahmen (Radständer etc.) → in Vorbereitung
- Sanitäranlagen, Rastplätze, Begegnungspunkte
- Naturspielplätze → in Vorbereitung
- Internetauftritt, GPS-Routen, Karte etc. → erst nach wesentlichen Baufortschritten
- Einbindung der Chiemseeringlinie, barrierefreie Haltestellen am Rundweg, Naturbeobachtungsstationen → erfolgt sowieso!

Ziel: Chiemseerundweg als zertifizierungsfähiges Premiumprodukt



**WIENINGER
BIER**
zur Fischhütt'n
am
Chiemsee-Randweg
150 m







Sassau

Keine Zufahrt
zum See

Landschafts-
schutzgebiet

Kein Hund
ausgelassen
werden
Büchse
mitbringen

Warning sign: yellow diamond on a white background.







